

新ごみ焼却施設等整備事業だより

Vol. 3 (令和5年4月)

皆様、こんにちは。鯖江クリーンセンターです。今回は、新しいごみ焼却施設の建設について、全体計画と進捗状況をお知らせいたします。

令和4年8月に契約を締結して以来、設計業務に着手し、今年の1月からは新施設建設用地内の既存施設解体および整地を進めています。

今後も建設用地の整地作業を続け、基礎工事に着手する予定です。これまで同様、工事全体の安全管理に万全を期して、工事が順調に進むよう努めてまいります。


▼工事概要

工 事 名	新ごみ焼却施設等建設工事
工 事 場 所	鯖江市西番町地係
工 期	令和4年8月25日～令和8年3月31日
敷 地 面 積	約17,000㎡
計 画 処 理 量	29,400 t/年
施 設 規 模	【 焼 却 施 設 】 98 t/日 (49 t/日×2 炉 24時間連続稼働) 【粗大ごみ処理施設】 20 t/5 h 【 発 電 設 備 】 約2,500 k w
処 理 方 式	流動床式焼却炉
供 用 開 始	令和8年4月1日予定
工 事 監 理 者	㈱中部設計
施 工 者	荏原・田中・サイト・フクシン 特定建設工事共同企業体

▼工事工程表

	契約 ▼			現時点 ▼												工事竣工 ▼																									
	令和4年度			令和5年度												令和6年度												令和7年度												令和8年度	
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
設計業務	■	■	■	■	■	■	■	■																																	
既存施設解体・整地						■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
土木建築工事																																									
プラント工事																																									
付属棟建設工事 (管理棟・計量棟等)																																									

▼配置計画図

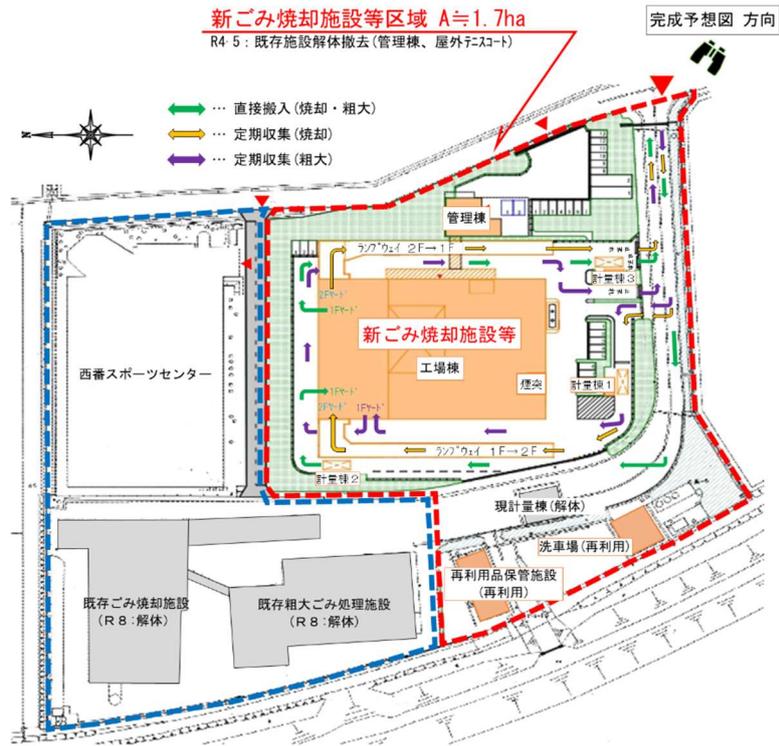


▼完成予想図

※実施設計を進める中で、色彩や外観が大きく変わることがあります。




▼工事の進捗状況

- ・ 既存施設解体前状況 (R5. 2. 9 撮影)

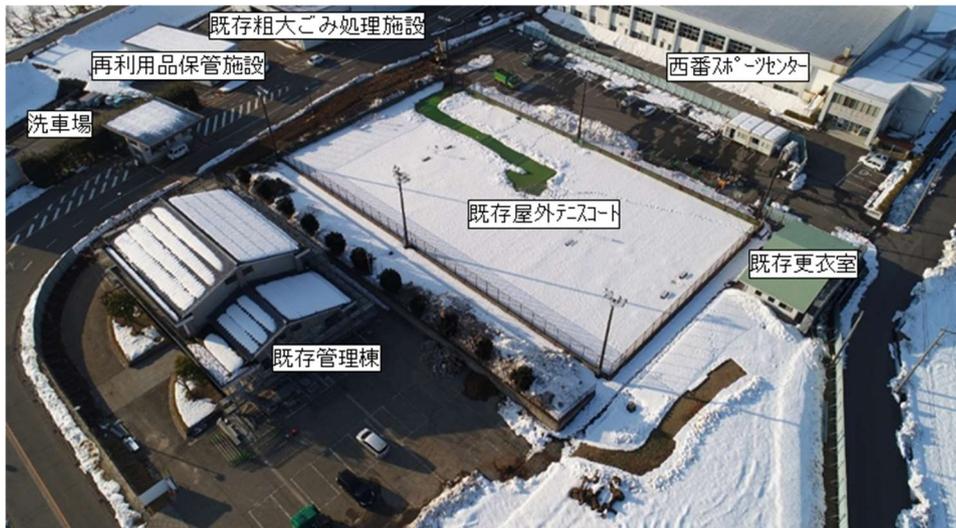

- ・ 既存管理棟上屋解体済状況 (R5. 2. 28 撮影)

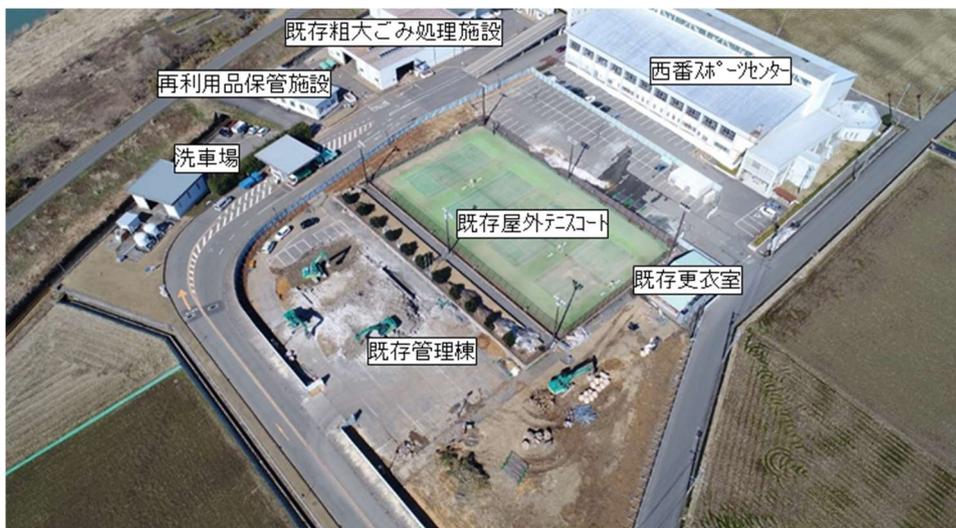

- ・ 既存屋外テニスコート、更衣室解体済状況 (R5. 3. 28 撮影)



▼工事の作業状況

- ・ 既存管理棟解体状況



- ・ 既存管理棟杭引抜き状況



- ・ 既存屋外テニスコート解体状況



- ・ 既存施設跡整地状況



※ 工事車両が運行していますのでクリーンセンターをご利用の際には、十分ご注意ください。また、騒音や交通規制によりご不便やご迷惑をおかけする場合がありますが、ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。
