

新ごみ焼却施設等整備事業だより

Vol. 6 (令和7年6月)

新ごみ焼却施設等建設工事の施工状況報告

皆様、こんにちは。鯖江クリーンセンターです。

いつもご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。


今回は、前回の「Vol.5」に引き続き、新しいごみ焼却施設等建設工事の進捗状況をお知らせいたします。

令和5年9月の着工以降、工場棟の土木建築工事が進められてきました。令和6年7月からはプラント工事、10月からは管理棟の建築工事も始まっています。

令和7年6月現在、工場棟・管理棟ともに鉄骨の組立てや主要構造工事（躯体工事）がほぼ完了し、内外装工事を行っています。

また、プラント工事では、各種機器の設置がほぼ完了し、現在は配管や配線を行っています。

● 工事の進捗を上空から望む（令和6年5月～令和7年4月）

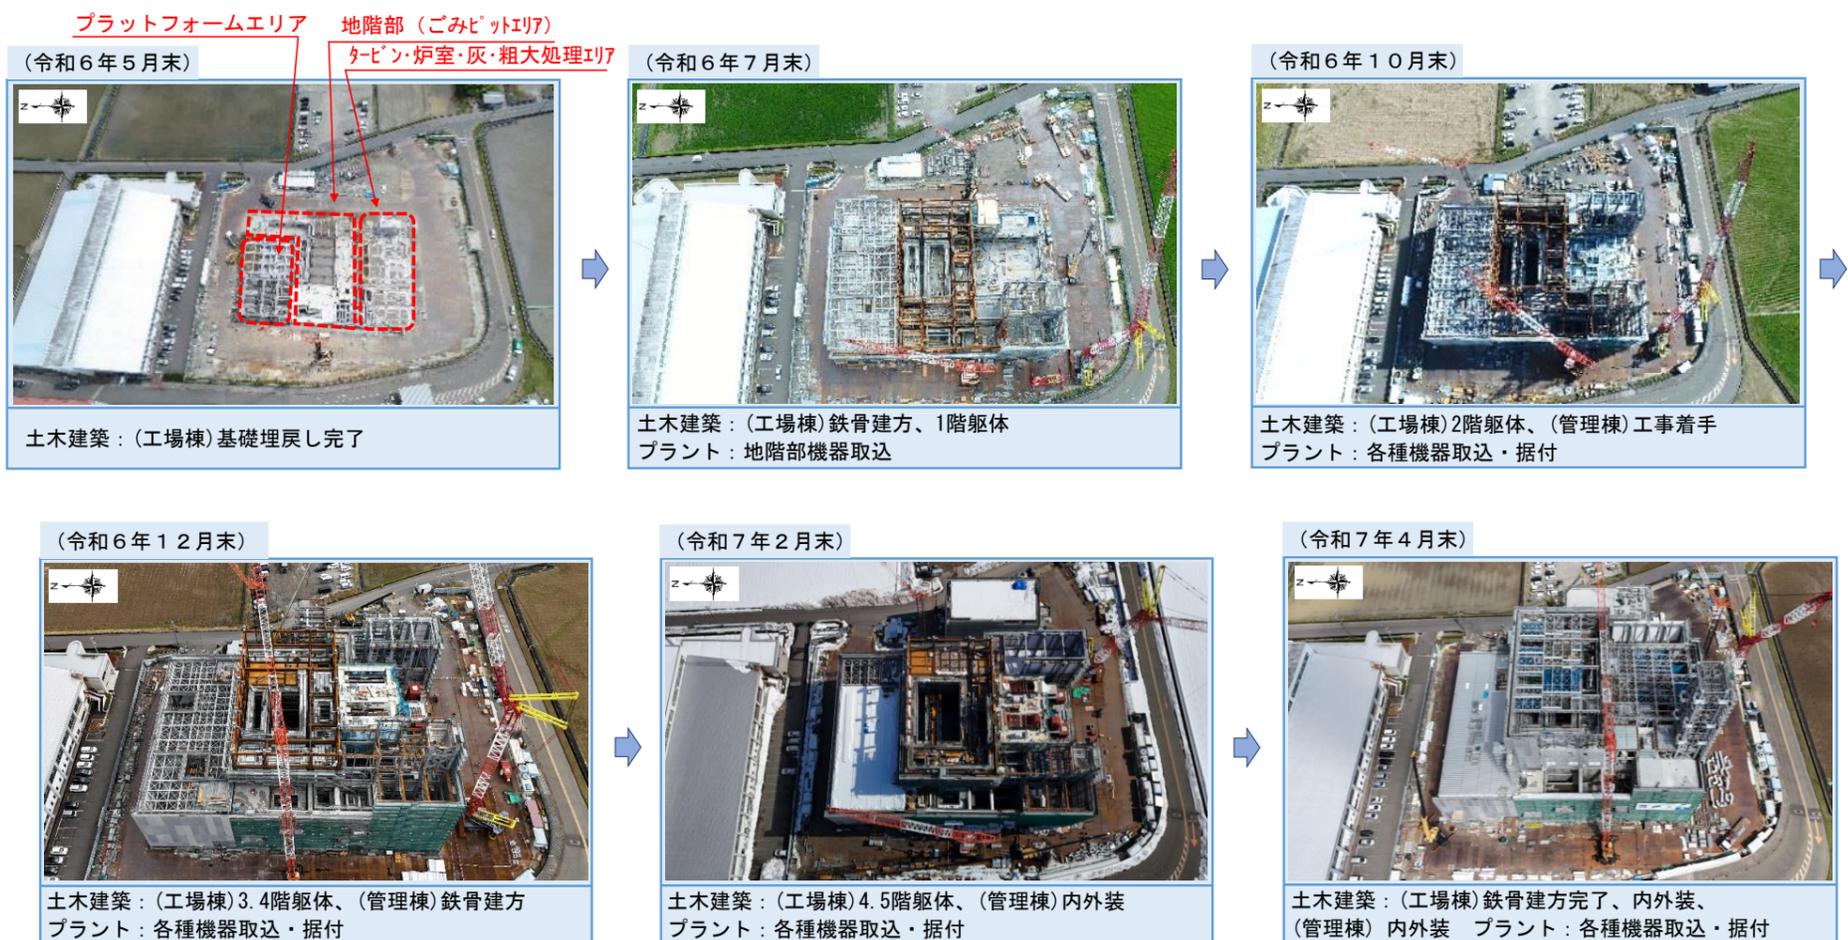

● 配置計画図



● 新ごみ焼却施設等イメージ図



温かみのあるアースカラーを使用し周辺環境と調和する景観デザインとします。

※令和7年6月時点の完成イメージ図のため変更の可能性があります。

建設工事のようす について

土木建築工事のようす

①【工場棟】(R6. 8. 19 撮影)
・コンクリート工事



(ごみピットエリア1階)
躯体の型枠にコンクリートを流しこんでいます。

②【工場棟】(R6. 9. 20 撮影)
・鉄骨工事



(蒸気タービン発電エリア)
鉄骨の建方を行っています。9月末の時点で建屋約38mの内約30mです。

③【工場棟】(R6. 12. 17 撮影)
・既製コンクリート、建具工事



(プラットホームエリア)
既製コンクリートパネル、アルミサッシ、硝子の取付状況です。

④【管理棟】(R6. 12. 17 撮影)
・鉄骨工事



(管理棟)
鉄骨の建方を行っています。

プラント工事のようす

①【工場棟】(R6. 7. 19 撮影)
・機器取込、据付工事



(可燃粗大破碎エリア地下1階)
可燃性粗大ごみ搬送コンベヤの据付を行っています

②【工場棟】(R6. 9. 17 撮影)
・機器取込、据付工事



(焼却炉室エリア2階)
焼却炉(2基の内1基目)の取込・据付を行っています。

③【工場棟】(R6. 12. 25 撮影)
・機器取込、据付工事



(焼却炉室エリア4階)
廃熱ボイラ(2基の内1基目)の取込・据付を行っています。

④【工場棟】(R7. 2. 20 撮影)
・機器取込、据付



(不燃粗大ごみ処理エリア1階)
粗大ごみ高速回転破碎機の据付を行っています。

工事の今後の予定 について

現在建設を進めている新しいごみ焼却施設(工場棟・管理棟)は、一部の外構工事を除き、令和7年9月末に建物本体の工事が完了する予定です。

その後は、令和8年4月の本格稼働に向け、機器の試運転や調整作業を行い、ごみ処理設備の性能を確認する工程に入ります。

なお、燃料や資材の価格高騰、供給の不安定さなど、厳しい状況が続いておりますが、安全を最優先に、着実に工事を進めてまいります。

引き続き、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

● 工程表 (令和7年6月時点)

【R7. 5月末現在 進捗率 78%】

現在地

年度	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度													
月	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
マイルストーン	契約			工事着工						調整・試運転						工事竣工										
建設工事	設計業務						土木建築工事(地下工事)			土木建築工事(地上工事)			プラント工事			管理棟等建設工事			機器調整・試運転			供用開始				
